sondeos martínez

DATOS DE LA OBRA

Promotor:	Rubén Salmuero	Presupuesto:	
Municipio:	T.M. de Cuenca	Nombre del pozo:	Rubén Salmuero
Fecha inicio:	2018	Fecha terminación:	2018

DATOS TECNICOS

Sistema :	Rotopercusión	Diámetro inicial:	280 mm.
Nivel estático:	123	Diámetro final:	250 mm.
Caudal l/s.:		Profundidad:	200 m.

PERFORACION

TRAMO	DESDE	HASTA	Ø DIAM.
1	0	3	280
2	3	200	250

ENTUBACION

TRAMO	DESDE	HASTA	Ø DIAM.	ESPESOR	TIPO DE TUBERIA
1	0	3	260	4	
2	0	200	200	4	

RANURADO

TRAMO	DESDE	HASTA	TIPO RANURADO
1	150	200	

LITOLOGIA

TRAMO	DESDE	HASTA	DESCRIPCION
1	0	145	Margas/ margocaliza
2	145	200	Calizas fisuradas

P: Perforación
E: Entubación
R: Ranurado

- T.M. de Cuenca -
CROQUIS DE POZO
Rubén Salmuero
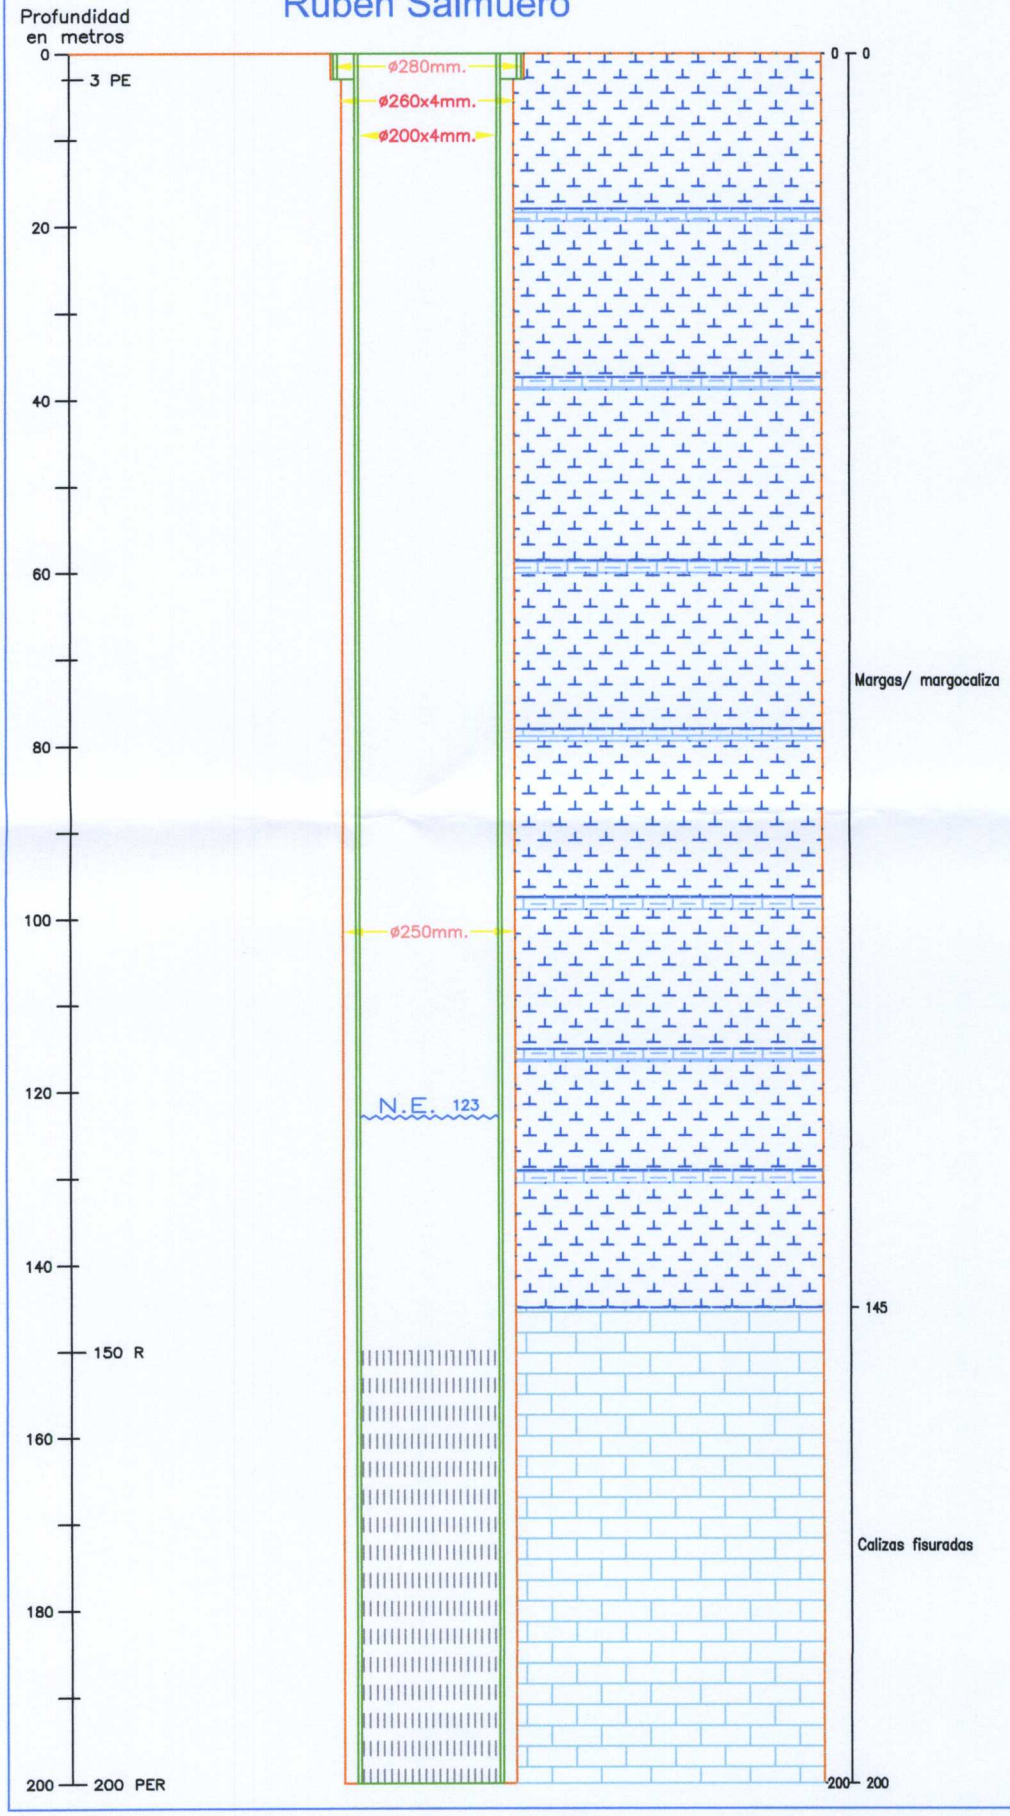
sondeos martínez
